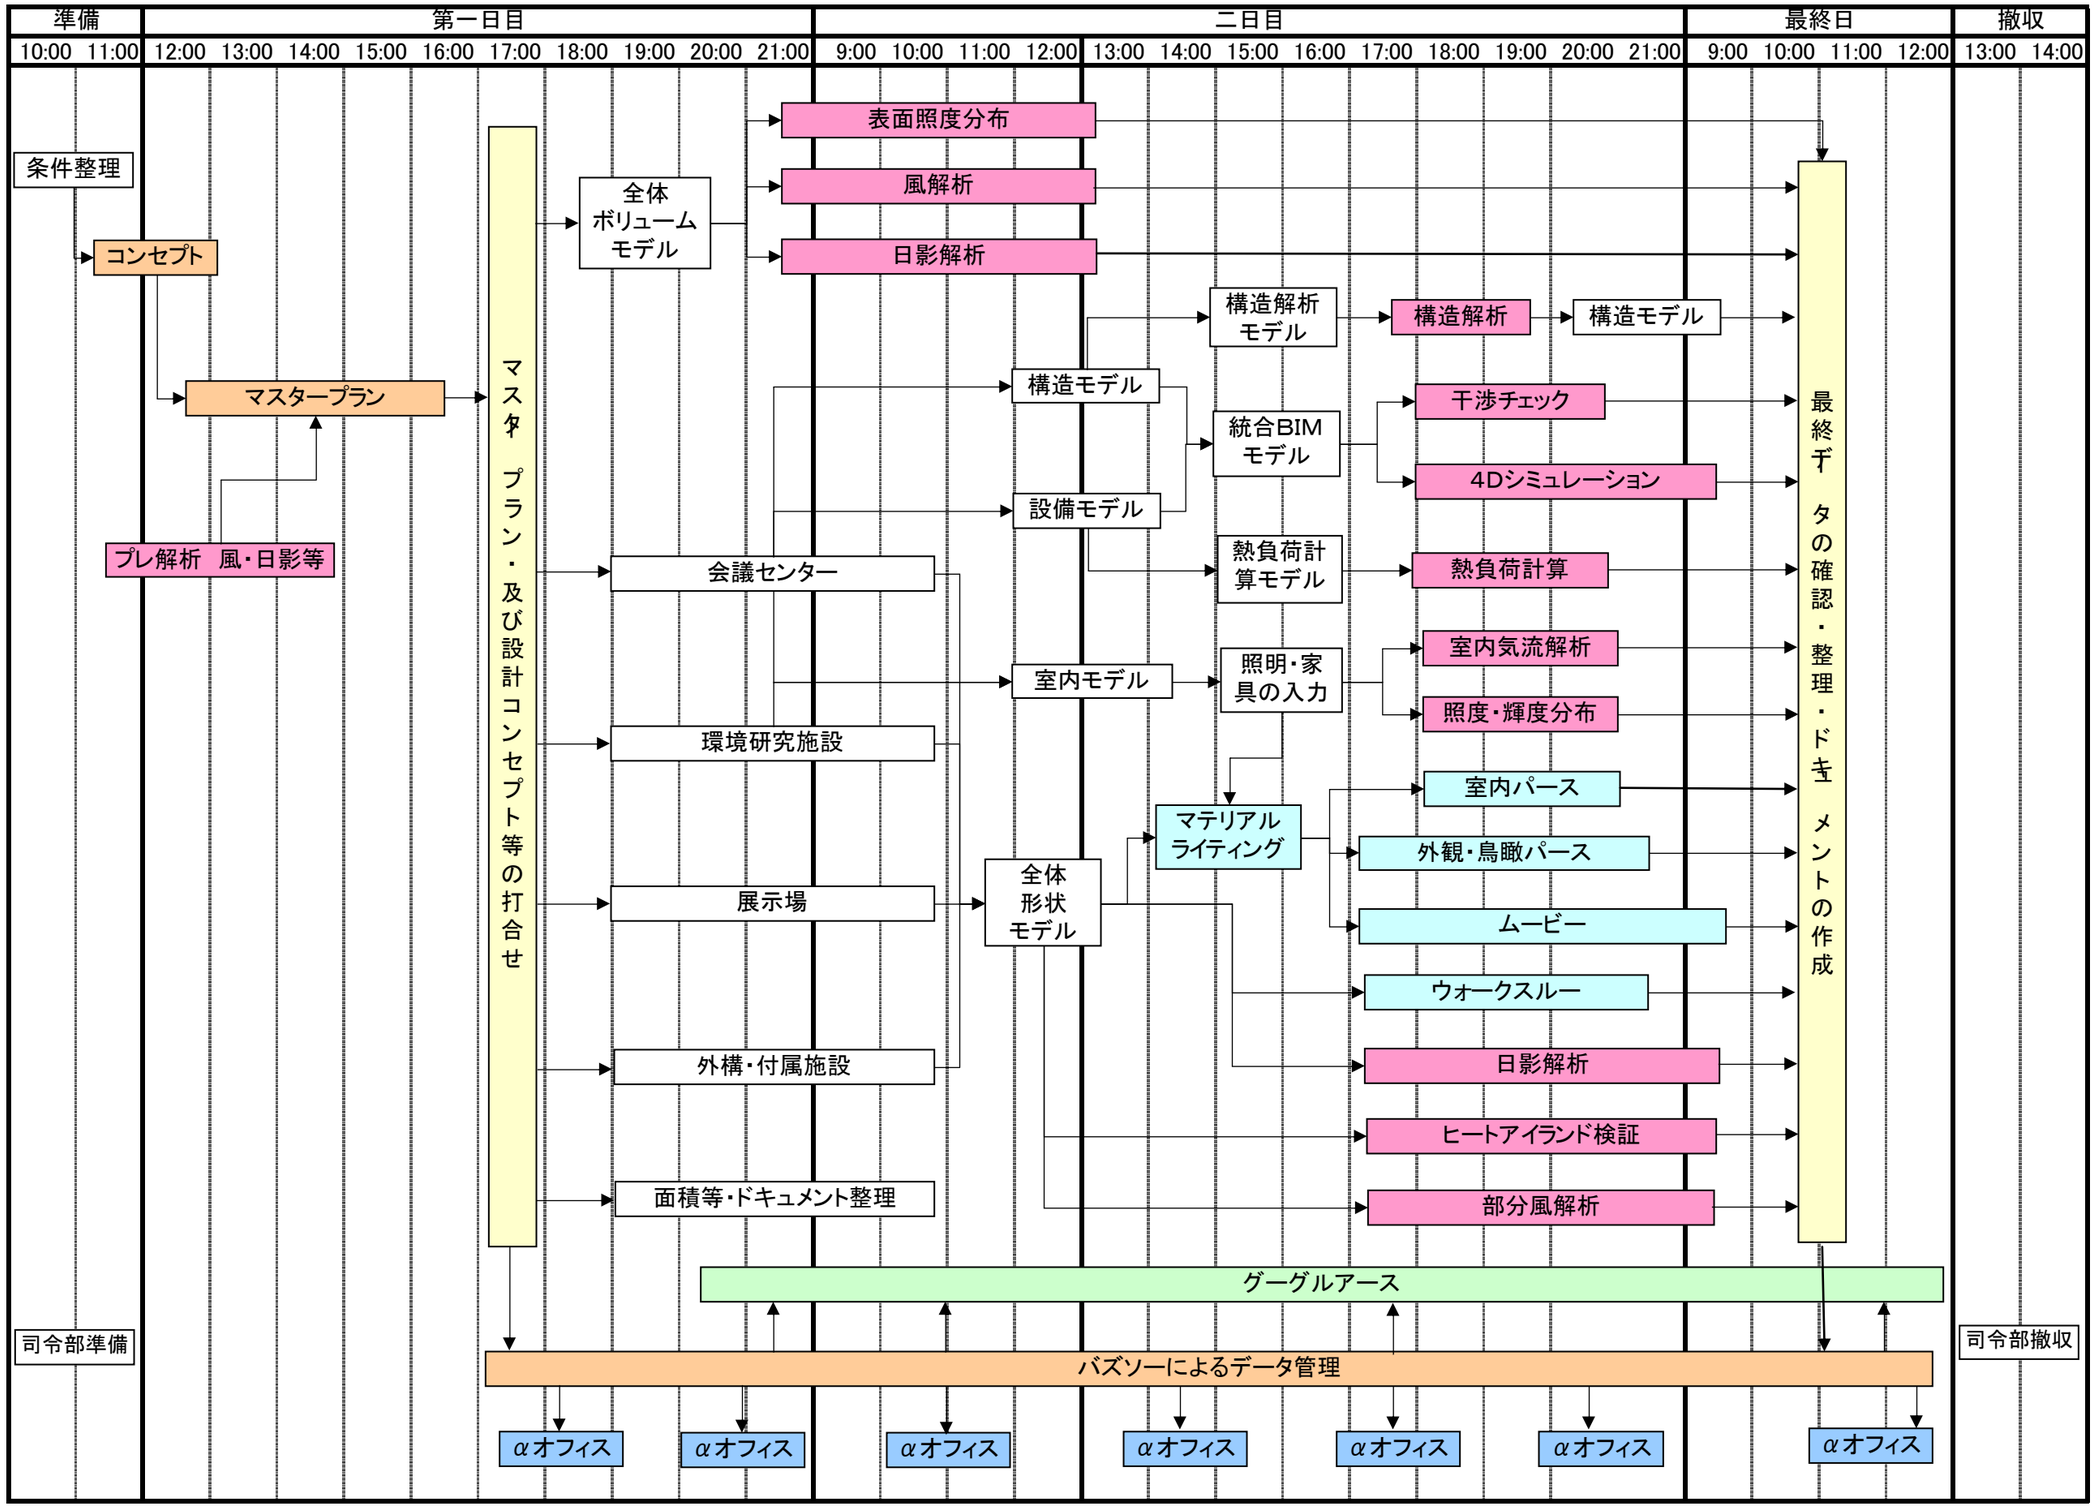
準備
第一日目
二日目
最終日
撤収
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
条件整理
コンセプト
マスタープラン
プレ解析　風・日影等
マスタープラン・及び設計コンセプト等の打合せ
全体ボリュームモデル
会議センター
環境研究施設
展示場
外構・付属施設
面積等・ドキュメント整理
表面照度分布
風解析
日影解析
構造モデル
設備モデル
室内モデル
全体形状モデル
構造解析モデル
構造解析
構造モデル
統合BIMモデル
干渉チェック
4Dシミュレーション
熱負荷計算モデル
熱負荷計算
照明・家具の入力
室内気流解析
照度・輝度分布
マテリアルライティング
室内パース
外観・鳥瞰パース
ムービー
ウォークスルー
日影解析
ヒートアイランド検証
部分風解析
最終データの確認・整理・ドキュメントの作成
グーグルアース
司令部準備
バズソーによるデータ管理
司令部撤収
αオフィス
αオフィス
αオフィス
αオフィス
αオフィス
αオフィス
αオフィス
